


東関東支店真栄会 躯体部会

狭隘な敷地での環境に配慮した
安全通路の工夫

大晃建設株式会社


■ 建物配置図

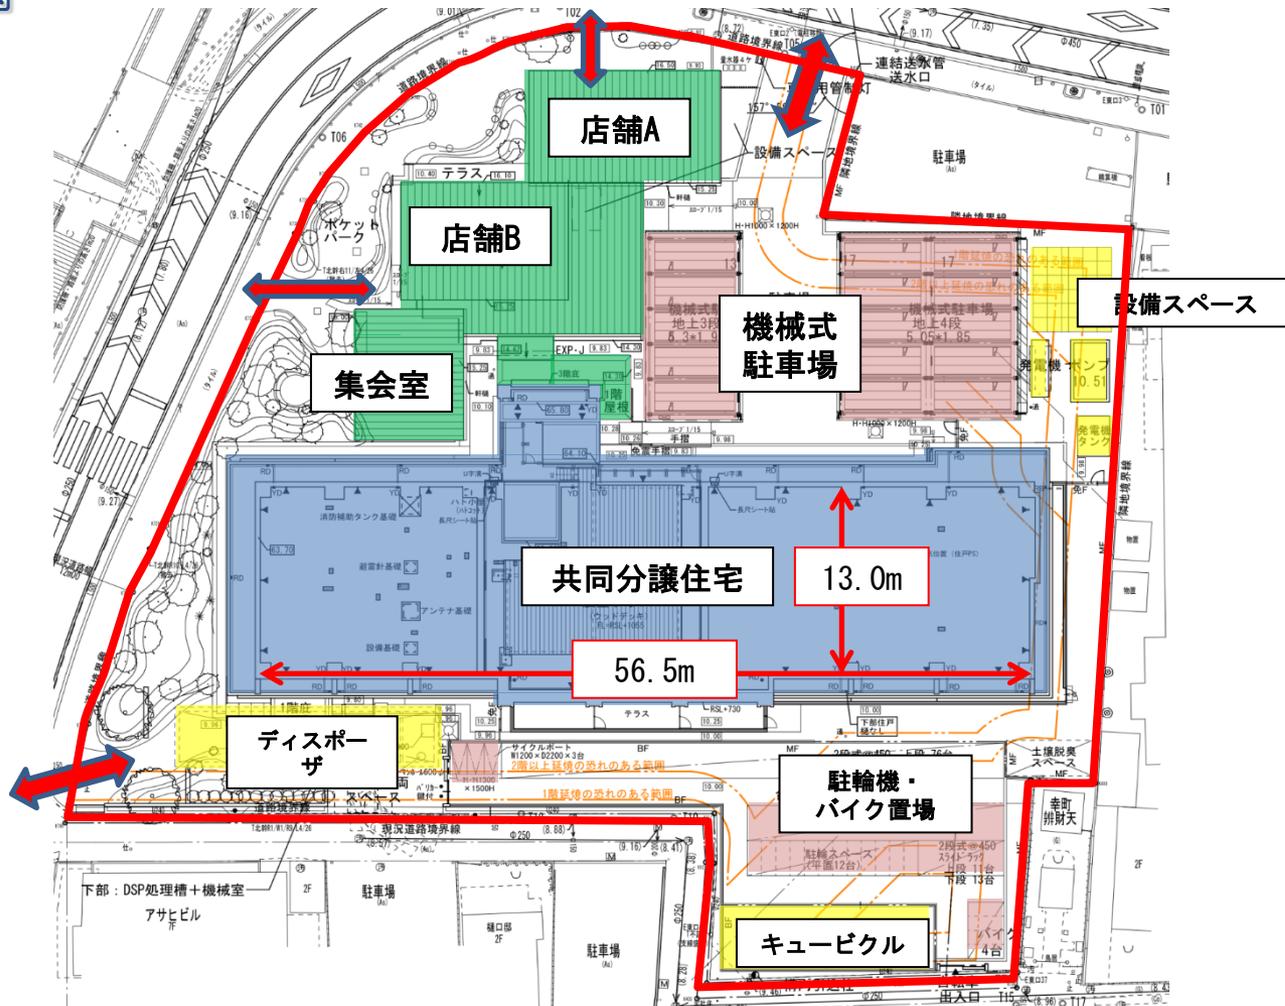


動機・ねらい

- 市街地における近隣に配慮しなければならない立地での工事で、しかも、敷地一杯の平面計画となっており、現場事務所までの通路を確保するのは困難であった。
- R型のパイプを使用することで、控えの内部を安全通路として活用、屋根もかけることにより、100mの全天候通路が完成した。
- 安全通路の養生ネットを利用し、グリーンカーテンに取り組み、環境に配慮した空間をつくった。

狭い敷地での安全通路計画

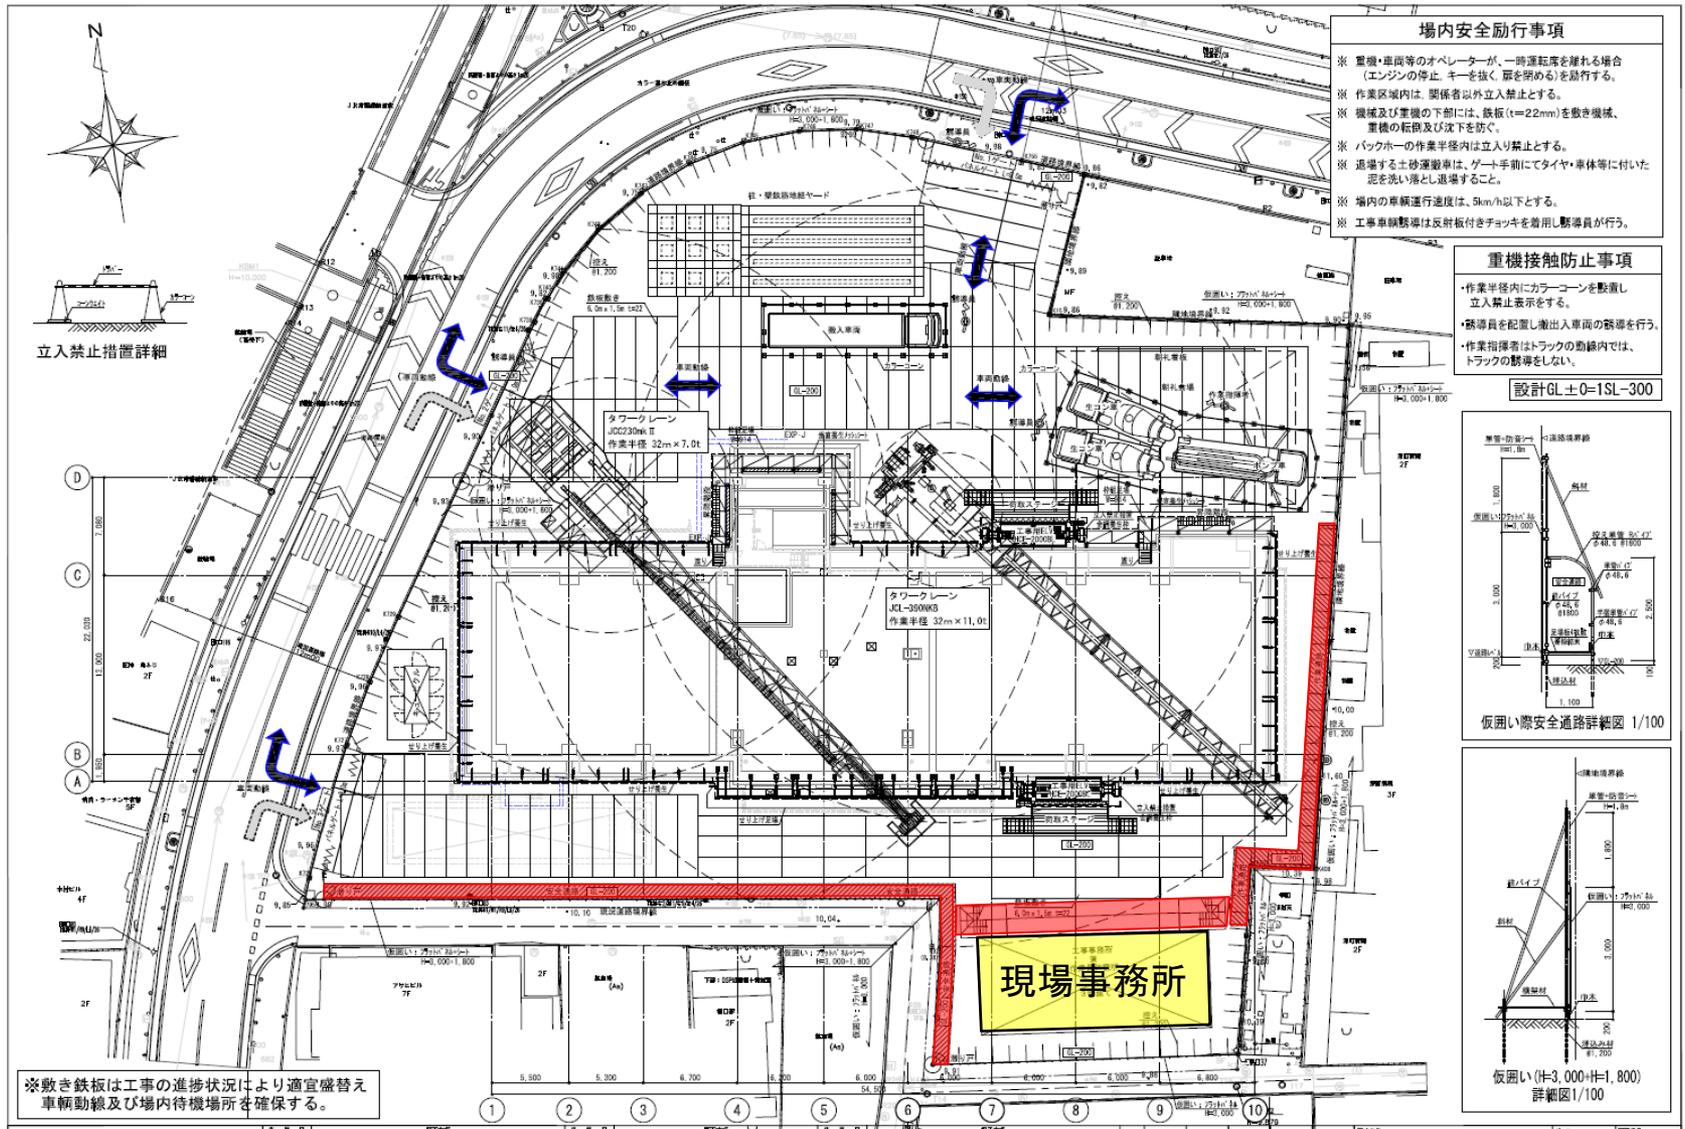

通路の概要

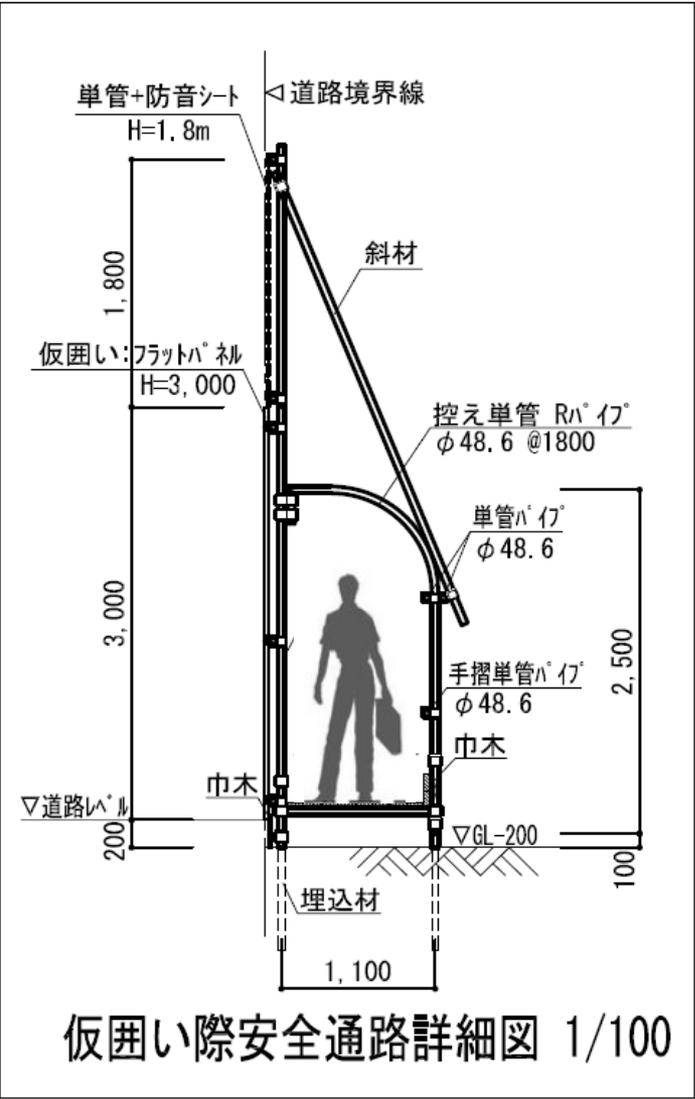

仮囲いの控え内部を通路にし、作業員や来客者の安全通路としました。

グリーンカーテンの設置

南面50mの通路を利用し、職長会と協力してグリーンカーテンを設置。
「緑のカーテンコンテスト」にも応募しました。



職長会による種まき風景。
(きゅうりやゴーヤなど)



実り状況。収穫した後は、
美味しくいただきました。


緑のカーテンコンテスト

緑のカーテンキャンペーン フォトコンテスト応募シート

作業所部門用

2021年 9月 9日

応募者名 (問い合わせ先・担当者)	所属部署名 (会社名)	三井住友建設株式会社	
TEL:	支店名	東関東 支店	
作業所名	作業所の住所 (賞状・賞品の送付先)	〒	
工事価格 (税抜) ※1			
設置概要 (大きさ、設置場所など)	敷地南側安全通路沿いに19プランター設置(W:600 D:250 H:200)		
植物の種類	アサガオ(紫・青)、風船かずら、きゅうり、ゴーヤ		
アピールポイント (育成等で工夫した点)	別紙可		



昨年度の緑のカーテンコンテストに応募し、緑化推進賞を受賞しました。
